

Iktatószám: IKT-2016-302-I1-00006308
Kedvezményezett neve: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Projekt címe: Pannon homoki élőhelyek fejlesztése
Projekt azonosítószám: VEKOP-4.2.1-15-2016-00005

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1525 Budapest, Postafiók 95.
 Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
 Aláírási jogosult képviselője: Oláh Gábor, helyettes államtitkár
 Azonosító szám (törzs-szám): PIR törzsszám: 303390
 Adószám: 15303392-2-41

másrésről [Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság], mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1121 Budapest, Költő utca 21.
 Székhely: 2509 Esztergom – Kertváros, Strázsa-hegy
 Azonosító szám (törzs-szám): 325763
 Adószám: 15325763-2-11
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01711813-00000000
 Aláírási jogosult képviselője: Fűri András, igazgató

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a továbbiakban: **VEKOP**) *Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése* tárgyú felhívására a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozattal elfogadott éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett 2016. május 31. napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2016. október 13. napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

Handwritten signatures and initials: a stylized 'A', 'di', and 'Si'.

Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása nem kezdhető meg, a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban Megvalósítás) költségeinek támogatása.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a *Pannon homoki élőhelyek fejlesztése* című támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek támogatására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet a Szerződés 8. melléklete szerinti helyszíneken megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: 2016. év május hó 2. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014. év január hó 1. nap.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje a projektfejlesztéshez kapcsolódóan betervezett, projektdokumentáció benyújtását tartalmazó mérföldkö időpontja.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a

projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról vagy elutasításáról.

Ha a Támogató a fenti határidőre benyújtott projektdokumentációt elutasítja, vagy a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021. év április hó 30. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2021. év május hó 30. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt éves fejlesztési keretben (1011/2016 (I. 20.) Korm. határozat) meghatározott tervezett összköltsége 300 000 000 Ft, azaz háromszázmillió forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó összköltsége 300 000 000 Ft, azaz háromszázmillió forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege 300 000 000 Ft, azaz háromszázmillió forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

A Projektben igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a. Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 103 390 012 Ft, azaz egyszázhárommillió-háromszázkilencvenezer-tizenkettő forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

300 000 000 Ft, azaz háromszázmillió forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg, amely különíten tartalmazza a projekt Előkészítésének mérföldköveit. A Megvalósítás mérföldkövei Szerződésmódosítással kerülnek meghatározásra.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket - a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.3.1. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- a) együttműködni a Támogatóval,
- b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott,

indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés a) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek

9. Záró rendelkezések

9.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

9.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.





9.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 12 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvásták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p style="text-align: center;">  Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Kedvezményezett  P.H. Kelt: Budapest, 2016. év 12. hónap 01. napján. </p>	<p style="text-align: center;">  Nemzetgazdasági Minisztérium Támogató  P.H. Kelt: Budapest, 2016. év 12. hónap 06. napján. </p>
--	--

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Konzorciumi megállapodás – nem releváns
7. melléklet - Közbeszerzési terv
8. melléklet - Projekt helyszíne
9. melléklet - Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet - Kommunikációs terv
11. melléklet - Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum – nem releváns
12. melléklet - Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-15-2016-00005
Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységar (Ft)	Nettó egységarra jutó ÁFA (Ft)	Összesen
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	1	403 150	108 850	512 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költsége	1	2 314 961	625 039	2 940 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	2 338 583	631 417	2 970 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	1	41 267 511	11 142 227	52 409 738
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	77 796 732	21 005 118	98 801 850



or
Si

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	1	6 000 000	0	6 000 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	1	236 221	63 779	300 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	1	29 601 318	7 992 356	37 593 674
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	1	4 204 725	1 135 275	5 340 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	1	75 590 133	0	75 590 133
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	1	7 200 000	0	7 200 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Általános (rezsi) költség	Egyéb általános (rezsi) költség	1	1 173 228	316 772	1 490 000



Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	1 062 992	287 008	1 350 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1	118 110	31 890	150 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Adók, közterhek (ide nem vonható áfát)	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	1	332 605	0	332 605
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	1	5 527 559	1 492 441	7 020 000
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:						300 000 000



Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 2016. év hónap napján.



Nemzeti Gazdasági Minisztérium
Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 2016. év hónap napján.



Európai Unió
Európai Strukturális
és Belsőügyi Alapok

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

alt Si

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-15-2016-00005
 Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Források	(Ft)
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	300 000 000
Összesen	300 000 000

[Handwritten signature]
 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
 Kedvezményezett

P.H.


Kelt: Budapest, 2016. év 12. hónap 01. napján.



[Handwritten signature]
 Nemzetgazdasági Minisztérium
 Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 2016. év 12. hónap 06. napján.



A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-15-2016-00005

Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Mérföldkő sorszama	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2017.01.16.	A projekt előkészítésének megkezdéséhez szükséges közbeszerzési eljárás megindítása.
2.	2017.02.28.	A Megvalósíthatósági tanulmány összeállítása és a Közbeszerzési tanácsadóval való együttműködés.
3.	2017.03.31.	A projektdokumentáció benyújtásra kerül.
4.	2017.05.31.	A projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges (kö)beszerzési eljárás lefolytatásának megkezdéséhez szükséges közbeszerzési dokumentáció és ajánlati felhívás rendelkezésre áll. A kisteherautó, a terepjáró és a kis értékű eszközök beszerzése, a gépjárművek üzembe helyezése.
5.	2017.11.30.	Kivitelezési munkálatok: vadkizáró kerítés, sorompók. Vállalkozói invazív irtási munkálatok. Erdőszerkezet átalakítás. 3+2 fős brigád által végzett invazív irtási munkálatok.
6.	2018.06.29.	Hulladékelszállítás a projekt területekről. A sorompók kivitelezési munkálatainak lezárása.
7.	2018.12.28.	A vadkizáró kerítések mentén kialakításra kerülő speciális kapuk kivitelezése lezárul, vállalkozó által végzett invazív irtás lezárul.
8.	2019.06.28.	Vadkizáró kerítés építése lezárul, műszaki ellenőri tevékenység lezárul, Földvásárlás.
9.	2020.10.30.	Erdőszerkezet átalakítás, ápolás és a hozzá kapcsolódó erdészeti szakfelügyelet.
10.	2021.04.30.	Brigád által végzett invazív irtási, vadkizáró kerítés karbantartási munkálatok lezárása, nyilvánosság tájékoztatása információs és tájékoztató táblák kihelyezésével, valamint zárórendelet lebonnyolításával.


Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Kedvezményezett


Nemzetgazdasági Minisztérium
Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 2016. év 12. hónap 01. napján.

Kelt: Budapest, 2016. év 12. hónap 06. napján.



A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-15-2016-00005
Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
7.	Invaszív irtás	A 14 projekt területen összesen 210 ha-on végzünk invazív irtást vállalkozó bevonásával. Fás- és lágyszárú invazív fajok visszaszorítását tervezzük lehetőleg mechanikus módszerekkel. Ha ezek eredménytelennek bizonyulnak, akkor vegyszeres módszerek alkalmazását is tervezzük. Az irtási munkálatokban a 3+2 fős brigád is részt vesz, főként a már kezelt területek utókezelését végzik majd.	210	ha	Öshonos faállományok természetes felújulásának elősegítése

B

8.	Vadkizáró kerítés építése	5 projekt helyszínen összesen mintegy 25 000 m vadkizáró kerítés kiépítése az erdők természetesen felújulásának biztosításához a megnövekedett vadállomány kizárása által. A nagykörösi projekt területen a Korábbi kerítések kiegészítése által új területek, illetve a korábban lekerített területek megóvása a cél.	25 000	m	Ezáltal jelentős mértékben javul az érintett erdők önmegújuló képessége, természetessége.
8.	Földvásárlás	Táborfalva térségében magántulajdonban lévő 1,29 ha és 4,7 ha kiterjedésű gyepterületek megvásárlása.	6	ha	A fokozottan védett fajok: Dianthus diutinus és a Carabus hungaricus védelme.
5.	Tereprendezés	Tóalmás térségében az illegális utak felszámolása sorompók és árkok kialakításával. Speciális sorompók kialakítása és a területek részleges körülárkolása segíthet a probléma megoldásában. Beavatkozások szükségesek a táborfalvai projektterületen is, ahol szintén illegális utakat alakítottak ki.	3	ha	A korábbi élőhelyek helyreállítása.
9.	Erdőszerkezet átalakítás	Szentmártonkő térségében 6 ha, míg Nagykő térségében 2 ha erdő besorolású terület átalakítását, hazai őshonos állományokkal való telepítését tervezzük, majd évente 2x-i ápolást és esetlegesen a csemeték pótlását.	8	ha	A korábban invazív fászarú növényfajokkal erősen fertőzött területek teljes átalakítása.



5.	Tanösvényfejlesztés	A toálmási projekt területen a Pannon Homoki élőhelyek bemutatását szolgáló tanösvény fejlesztést tervezzük. 1 db kisebb kilátó kialakítása, illetve pihenőhely: 2 db kültéri asztal, 7 db pad kialakítása, valamint 1 db információs tábla elhelyezése.	1	db	A tanösvénynek köszönhetően hosszútávra biztosítható az élőhely fennmaradása.
6.	Hulladékmentesítés	A projekt területekről a főként inert és lakossági hulladék összegyűjtése és elszállítása a cél.	876	m ³	Az élőhelyek természetességének helyreállítása és a pontszerű szennyezések felszámolása.
6.	Speciális texasi kapuk kialakítása	A nagykorúsi projekt területen 22 db texasi kapu kerül kialakításra, segítve a vadkizáró kerítések által mesterségesen alacsonyban tartott vadlétszám biztosítását.	22	db	Vadlétszám alacsonyban tartása, bekerített erdők természetes megújulása
5.	Sorompók kihelyezése	A természetvédelmi területen illegálisan végzett technikai sportok környezeti terhelésének mérséklése.	37	db	A technikai sportok által létrehozott nyílt homokos felszínek visszagyepesülése.



Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 2016. év hónap napján.



Nemzeti Gazdasági Minisztérium
Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 2016. év hónap napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-15-2016-00005
Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A természetvédelmi helyzet javítása érdekében tett intézkedések által érintett élőhelyek kiterjedése	-	-	2021.04.30.	874	874	874

Sz. Á. Á.
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Kedvezményezett

P.H.



Kelt: Budapest, 2016. év hónap napján.

P.H.
Nemzetgazdasági Minisztérium
Támogató



Kelt: Budapest, 2016. év hónap napján.

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Támogatásban részesített projekt megvalósítására

Nem releváns

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-15-2016-00005
Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Építés	11 655 000	Nemzeti ért.határ - Meghívásos (Kbt.2015)	Sorompók kihelyezése
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Árubeszerezés	23 622 047	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	Eszközbeszerezés
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szolgáltatás	19 598 022	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	Invazív irtási munkálatok
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Építés	62 598 425	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	Vadkizáró kerítés és speciális kapuk építése
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szolgáltatás	8 305 512	Nemzeti ért.határ - Meghívásos (Kbt.2015)	Hulladék elszállítás
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szolgáltatás	2 314 961	Egyéb	Közbeszerzési tanácsadó



Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 2016. év hónap napján.



Nemzetgazdasági Minisztérium
Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 2016. év hónap napján.

PROJEKT HELYSZÍNE

2252 Tóalmás, 0133/54 helyrajzi szám
2252 Tóalmás, 0133/51a helyrajzi szám
2252 Tóalmás, 0133/51b helyrajzi szám
2252 Tóalmás, 0133/44 helyrajzi szám
2252 Tóalmás, 0133/55a helyrajzi szám
2252 Tóalmás, 0133/55b helyrajzi szám
2252 Tóalmás, 0133/55c helyrajzi szám
2252 Tóalmás, 0133/56 helyrajzi szám
2252 Tóalmás, 0133/57a helyrajzi szám
2252 Tóalmás, 0133/57b helyrajzi szám
2252 Tóalmás, 0133/57c helyrajzi szám
2252 Tóalmás, 0133/57d helyrajzi szám
2252 Tóalmás, 0133/58 helyrajzi szám
2252 Tóalmás, 0133/59 helyrajzi szám
2252 Tóalmás, 0133/60a helyrajzi szám
2252 Tóalmás, 0133/60b helyrajzi szám
2252 Tóalmás, 0133/60c helyrajzi szám
2730 Albertirsa, 073/2a helyrajzi szám
2730 Albertirsa, 0168 helyrajzi szám
2730 Albertirsa, 0173/1 helyrajzi szám
2730 Albertirsa, 0173/2b helyrajzi szám
2760 Nagykáta, 038/87a helyrajzi szám
2760 Nagykáta, 038/87b helyrajzi szám
2760 Nagykáta, 038/87c helyrajzi szám
2760 Nagykáta, 5418 helyrajzi szám

- 2760 Nagykáta, 5421 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5422 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5423 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5429 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5433 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5434 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5435 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5436 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5438 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5439 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5440 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5441 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5442 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5443 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5444 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5446 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5447 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5448 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5449 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5451 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5452 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5454 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5456 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5457 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5458 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5459 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5460 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5461 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5462 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5463 helyrajzi szám

2760 Nagykáta, 5464 helyrajzi szám
2760 Nagykáta, 5469 helyrajzi szám
2760 Nagykáta, 5470 helyrajzi szám
2760 Nagykáta, 5472 helyrajzi szám
2760 Nagykáta, 5473 helyrajzi szám
2760 Nagykáta, 5475 helyrajzi szám
2760 Nagykáta, 5476 helyrajzi szám
2760 Nagykáta, 5477 helyrajzi szám
2760 Nagykáta, 5478 helyrajzi szám
2760 Nagykáta, 5479 helyrajzi szám
2760 Nagykáta, 5480 helyrajzi szám
2760 Nagykáta, 5481 helyrajzi szám
2760 Nagykáta, 5482 helyrajzi szám
2760 Nagykáta, 5483 helyrajzi szám
2760 Nagykáta, 5484 helyrajzi szám
2760 Nagykáta, 5485 helyrajzi szám
2760 Nagykáta, 5486 helyrajzi szám
2760 Nagykáta, 5487 helyrajzi szám
2760 Nagykáta, 5488 helyrajzi szám
2760 Nagykáta, 5489 helyrajzi szám
2760 Nagykáta, 5490 helyrajzi szám
2760 Nagykáta, 5491 helyrajzi szám
2760 Nagykáta, 5492 helyrajzi szám
2760 Nagykáta, 5493 helyrajzi szám
2760 Nagykáta, 5494 helyrajzi szám
2760 Nagykáta, 5495/2 helyrajzi szám
2760 Nagykáta, 5496 helyrajzi szám
2760 Nagykáta, 5497 helyrajzi szám
2760 Nagykáta, 5498 helyrajzi szám
2760 Nagykáta, 5499 helyrajzi szám

- 2760 Nagykáta, 5500 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5501 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5503 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5504 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5507 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5508 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5509 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5510 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5513 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5514 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5516 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5518 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5519 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5520 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5521 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5522 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5523 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5524 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5525 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5526 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5527 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5528 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5529 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5530 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5531 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5532 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5534 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5535 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5536 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5537 helyrajzi szám

- 2760 Nagykáta, 5538 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5539 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5540 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5541 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5542 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5543 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5544 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5545 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5546 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5547 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5548 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5549 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5550 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5551 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5552 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5553 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5554 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5556 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5557 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5558 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5559 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5560 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5562 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5563 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5564 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5565 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5566 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5568 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5570 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta, 5571 helyrajzi szám

2760 Nagykáta, 5622 helyrajzi szám
2760 Nagykáta, 5623 helyrajzi szám
2760 Nagykáta, 5624 helyrajzi szám
2760 Nagykáta, 5625 helyrajzi szám
2760 Nagykáta, 5425 helyrajzi szám
2760 Nagykáta, 5555 helyrajzi szám
2760 Nagykáta, 5445 helyrajzi szám
2760 Nagykáta, 5450 a, b helyrajzi szám
2760 Nagykáta, 5511 helyrajzi szám
2750 Nagykőrös, 0689 helyrajzi szám
2750 Nagykőrös, 0700/2a helyrajzi szám
2750 Nagykőrös, 0744/1a helyrajzi szám
2750 Nagykőrös, 0733/2 helyrajzi szám
2750 Nagykőrös, 0734/2 helyrajzi szám
2750 Nagykőrös, 0730/1 helyrajzi szám
2750 Nagykőrös, 0799/8 helyrajzi szám
2750 Nagykőrös, 0799/2 helyrajzi szám
2750 Nagykőrös, 0799/9 helyrajzi szám
2750 Nagykőrös, 0799/7 helyrajzi szám
2750 Nagykőrös, 0792/1 helyrajzi szám
2750 Nagykőrös, 0799/4 helyrajzi szám
2750 Nagykőrös, 0792/2 helyrajzi szám
2750 Nagykőrös, 0796 helyrajzi szám
2750 Nagykőrös, 0799/3 helyrajzi szám
2750 Nagykőrös, 0797/3 helyrajzi szám
2750 Nagykőrös, 0797/4 helyrajzi szám
2750 Nagykőrös, 0802 helyrajzi szám
2750 Nagykőrös, 0807/15 helyrajzi szám
2750 Nagykőrös, 0806/3 helyrajzi szám
2750 Nagykőrös, 0806/4a helyrajzi szám

- 2750 Nagykőrös, 0799/6 helyrajzi szám
- 2750 Nagykőrös, 0798 helyrajzi szám
- 2750 Nagykőrös, 0744/4b helyrajzi szám
- 2750 Nagykőrös, 0786/13 helyrajzi szám
- 2750 Nagykőrös, 0786/12 helyrajzi szám
- 2750 Nagykőrös, 0786/22a helyrajzi szám
- 2750 Nagykőrös, 0693/1 helyrajzi szám
- 2750 Nagykőrös, 0691 helyrajzi szám
- 2750 Nagykőrös, 0692 helyrajzi szám
- 2750 Nagykőrös, 0793/1c helyrajzi szám
- 2750 Nagykőrös, 0792/3 helyrajzi szám
- 2750 Nagykőrös, 0791 helyrajzi szám
- 2750 Nagykőrös, 0786/4a helyrajzi szám
- 2750 Nagykőrös, 0786/4b helyrajzi szám
- 2750 Nagykőrös, 0786/21a helyrajzi szám
- 2750 Nagykőrös, 0786/19a helyrajzi szám
- 2750 Nagykőrös, 0786/19b helyrajzi szám
- 2750 Nagykőrös, 0690/3a, b, c helyrajzi szám
- 2750 Nagykőrös, 0786/20 helyrajzi szám
- 2254 Szentmártonkáta, 0285/3 helyrajzi szám
- 2254 Szentmártonkáta, 0284 helyrajzi szám
- 2254 Szentmártonkáta, 0283/1 helyrajzi szám
- 2117 Isaszeg, 035/1a helyrajzi szám
- 2182 Domony, 0122/2 helyrajzi szám
- 2114 Valkó, 019d helyrajzi szám
- 2114 Valkó, 027/1a helyrajzi szám
- 2114 Valkó, 023 helyrajzi szám
- 2114 Valkó, 024/1a helyrajzi szám
- 2114 Valkó, 025 helyrajzi szám
- 2114 Valkó, 028 helyrajzi szám

- 2114 Valkó, 029 helyrajzi szám
- 2119 Pécel, 0225b helyrajzi szám
- 2119 Pécel, 0225c helyrajzi szám
- 2119 Pécel, 0211a helyrajzi szám
- 2119 Pécel, 0211b helyrajzi szám
- 2212 Csévharaszt, 0229/2 helyrajzi szám
- 2212 Csévharaszt, 0241/4 helyrajzi szám
- 2310 Szigetszentmiklós, 12001/10a helyrajzi szám
- 2310 Szigetszentmiklós, 12001/10b helyrajzi szám
- 2310 Szigetszentmiklós, 12001/10c helyrajzi szám
- 2381 Táborfalva, 040/10b helyrajzi szám
- 2381 Táborfalva, 040/24 helyrajzi szám
- 2015 Szigetmonostor, 085/2a helyrajzi szám
- 2015 Szigetmonostor, 085/2d helyrajzi szám
- 2713 Csemő, 020/14 helyrajzi szám




Erőss András

Duna-Ípoly Nemzeti Park Igazgatóság
Kedvezményezett

P.H.

Kelt Budapest, 2016. év *12* hónap *01*
napján.

Stankó János
Nemzetgazdasági Minisztérium
Támogató



Kelt: Budapest, 2016. év *12* hónap *06*
napján.


RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL


1. Szigetmonostor: a 6 ha összkiterjedésű beavatkozási területen komoly erőfeszítéseket kell tennünk az invazív fajok visszaszorítása érdekében. Mind az akác, mind a bálványfa tömegével fordul elő és rendkívül agresszíven terjed. A kiirtásukra tett számos korábbi próbálkozás sok esetben az ellenkező eredményt hozta, ezért nagyon körültekintően kell eljárunk a kezelés során. Az ilyen és ehhez hasonló területek miatt terveztünk be alvállalkozói díjat is a brigád tevékenységével párhuzamosan. A vállalkozó, aki hosszú évek tapasztalatával rendelkezik eredményesebb lehet, mint a kevés tapasztalattal bíró brigádtagok. Az utókezelésekben azonban a brigádé a főszerep.
2. Domony térségében egy 10 ha-os területen tervezünk beavatkozást: vadkizáró kerítéssel történő elkerítés (2000m) és invazív mentesítés a tervezett feladatok.
3. A valkói beavatkozási területen mintegy 2500 méter hosszúságban vadkizáró kerítés megépítése és cserjeirtás, valamint invazív fás- és lágyszárú növényfajok vegyszeres visszaszorítását tervezzük.
4. Az isaszegi projekterületen 1000 méter hosszúságban vadkizáró kerítés megépítése és szintén cserjeirtás, valamint invazív fás- és lágyszárú növényfajok vegyszeres visszaszorítása a fő tevékenység a 3 hektáros területen.
5. Pécel térségében 25 ha-on cserjeirtás és invazív fás- és lágyszárú növényfajok vegyszeres visszaszorítása a tervezett feladat a Pécel 0225b és c helyrajzi számú területeken. A 0211a és b hrsz-ú területeken mintegy 10 ha területen cserjeirtás és invazív fás- és lágyszárú növényfajok vegyszeres visszaszorítása a tervezett tevékenység.
6. A Tápiógyörgyei Örkerület főként gyepes területein az eddigiekhez képest sokkal diverzebbek a feladatkörök. A tóalmási projekterületen a hulladékeltávolítás (173 m³) jelenti az egyik fő tevékenységet. Élőhely kezelés szempontjából fontos tényező, hogy a területet egy gazdálkodó legelteti juhokkal. Az együttműködés és a gazdálkodás fenntartása érdekében villanypásztor rendszer (6 km) és gémeskút kialakítása a feladat. A tanösvény fejlesztés szintén ezen a helyszínen valósul meg. Az illegális utakat sorompós lezárásokkal és árkolással kívánjuk megszüntetni. A gyepes területen elszórtan 6 db fél hektáros nyárfa ligetet tervezünk kialakítani az élőhelyek diverzitásának növelése érdekében.
7. Szentmártonkátán szintén fás- és lágyszárú invazivok irtása a fő tevékenység, de 6 hektár erdős területen teljes szerkezetátalakítást tervezünk megvalósítani. 120 m³ hulladék elszállítása és 6 sorompó kihelyezése is terveink közt szerepel, így csökkentve az ember okozta környezetterhelést.
8. A nagykatái Csehdombon szintén tervezünk egy 2 hektáros erdőterületen szerkezetátalakítást. Az invazivok (selyemkóró, akác) visszaszorítása itt is nagyon komoly erőfeszítéseket kíván. Az illegális utak, motoros ösvények megszüntetés érdekében 6 sorompó kihelyezésére kerül sor.
9. A nagykatái Erdőszőlő egy egykori zártkertes terület, melyben napjainkra szinte mindenhol felhagytak a gazdálkodással. A terület döntő részben a Tápió Közalapítvány tulajdonában áll. Az ezüstfa, az akác és a bálványfa agresszíven terjeszkedik, míg a kiterjedt gyepes területeken a selyemkóró hódít. Kis mértékű tereprendezés és kb. 140 m³ hulladék elszállítása szerepel a tervezett feladatok között.
10. Az albertirsai Hársas-völgyben invazív fásszerűak irtása a legfőbb teendő mintegy 40 ha-on. Az őshonos fajok természetes újulatainak megsegítésére 5,5 km hosszán kerítés építése is szükséges.
11. Csepéharaszton a korábban megkezdett Tartós szegfű LIFE és HUSK pályázatok folytatásaként a borókások felújítása és az akác kiirtása a legfontosabb feladat a kijelölt 14,5 hektáron.
12. Nagykörsön a korábbi LIFE projekt folytatásaként és levonva a tanulságokat az új kerítés szakaszok (15 km hosszán) már úgy lettek kijelölve, hogy könnyebb legyen az ellenőrzésük, az építendő kapuk pedig várhatóan biztosabb védelmet nyújtanak majd a vadállomány kizárásában (22 db texasi kapu). Ezen kapuk tervezés folyamatban van.

13. Táborfalva térségében egy 6 ha-os gyepterület kezelését tervezzük, melyre vételi szándékunk is van a pályázat keretein belül. A tulajdonossal folytatott egyeztetések során határozott eladási szándékát fejezte ki. A terület jelenleg nem áll védelem alatt, de számos közösségi jelentőségű faj található rajta (Tartós szegfű)

14. A Csepelszigeten Szigetszentmiklós térségében található projekt helyszínen invazív irtást és lakossági, illetve inert hulladék elszállítását tervezzük. A projekt területek döntő többsége Natura2000 terület, vagy annak közvetlen környezetében található. Ezekre a területekre a fenntartási tervek elkészültek és rendelkezésre állnak. A Natura2000 védelemmel nem rendelkező területek esetében a fenntartási tervek megléte, valamint projekt során történő elkészítése nem releváns, mivel védelem nem élvez. Az ott található védett fajok azonban fontosak az élőhelytípusok természetes változatosságának megőrzése szempontjából. Ezért fontos, hogy a projekt részét képezzék.

A helyrajzszám változással érintett projektterületek áttekintő térképe, kiemelve a Nagykáta 5450 a, b, valamint a Nagykőrös 0797/3 hrsz-ek:

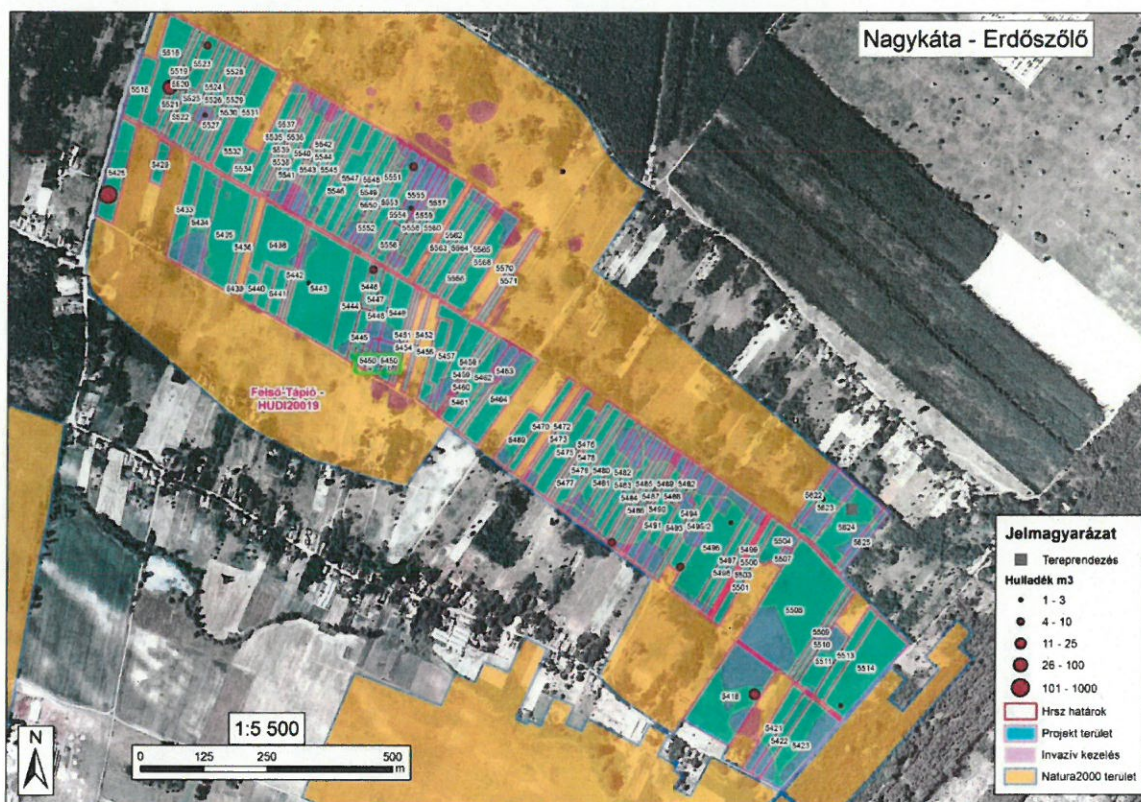

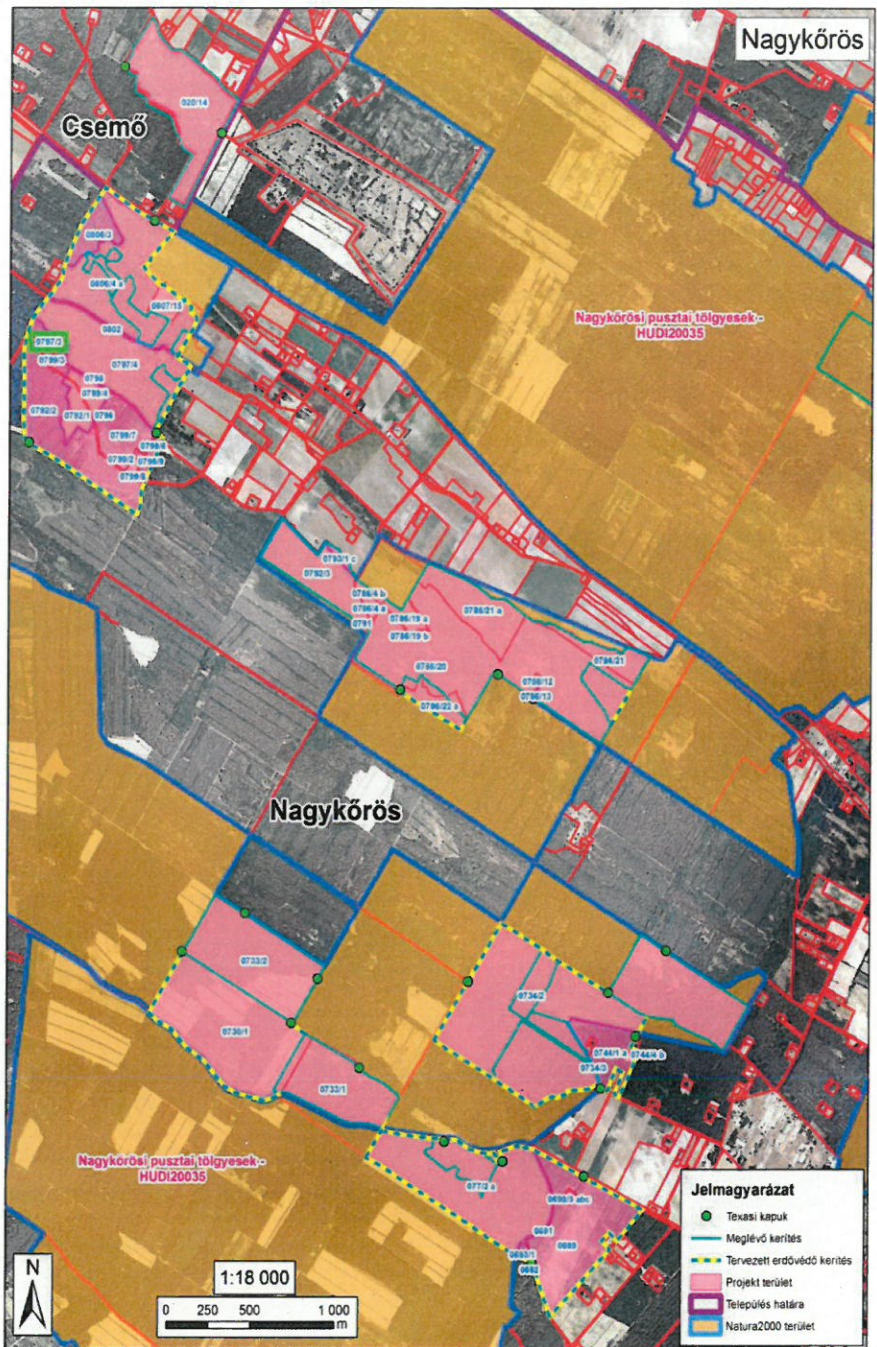

Frany András
Duna-IPoly Nemzeti Park Igazgatóság
Kedvezményezett

P.H.

Kelt Budapest, 2016. év ... 12 ... hónap ... 01 ... napján.

Olvasó
Nemzetgazdasági Minisztérium
Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 2016. év ... 12 ... hónap ... 06 ... napján.



KOMMUNIKÁCIÓS TERV

- Kommunikációs terv készítése (saját teljesítés)
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (saját teljesítés)
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (saját teljesítés)
- Fotódokumentáció készítése (saját teljesítés)
- Térképtér feltöltése (saját teljesítés)
- 1 db „B” típusú tábla
- 14 db „D” típusú tábla
- A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig
- Záró rendezvény



Füredi András
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Kedvezményezett

P.H.

Kelt Budapest, 2016. év 12. hónap 01. napján.

Blum
Nemzetgazdasági Minisztérium
Támogató



Kelt: Budapest, 2016. év 12. hónap 06. napján.



**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

Nem releváns

**EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)
NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT,
UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI**

Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Támogatási kérelem száma: VEKOP-4.2.1-15-2016-00005

Projekt címe: A Pannon homoki élőhelyek fejlesztése

A VEKOP-4.2.1-15-2016-00005 azonosító számú projekt keretében elszámolni kívánt költségeket az alábbi finanszírozási mód szerint kívánjuk elszámolni.

Költségkategória	Finanszírozási mód
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Utófinanszírozás
Projektmenedzsment utazási költsége	Utófinanszírozás
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség	Utófinanszírozás
Közbeszerzés költsége	Szállítói finanszírozás
Műszaki ellenőri szolgáltatás költségei	Szállítói finanszírozás
Ingtatlan értékbecslés	Utófinanszírozás
Erdészeti szakfelügyelet	Szállítói finanszírozás
Invaszív irtás 14 területre (Vállalkozó szerződés keretei között)	Szállítói finanszírozás
Gyepkezelés, ligetkialakítás	Szállítói finanszírozás
Erdészeti munkálatok - szerkezetátalakítás	Szállítói finanszírozás
Hulladék elszállítás, tereprendezés	Szállítói finanszírozás
Terepjárához, kisteherautóhoz kapcsolódó költségek (üzembe helyezés, éves kötelező szervíz, KGFB+casco+egyszeri műszaki vizsgáztatás)	Vegyes finanszírozás
Engedélyek (vegyszerhasználati engedélyek beszerzése)	Utófinanszírozás
Üzemanyag a pályázatból vásárolt gépekhez	Utófinanszírozás
Kötelező előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Vegyes finanszírozás
Marketing és kommunikációs szolgáltatás	Utófinanszírozás
Képzéshez kapcsolódó költségek	Utófinanszírozás
Beruházáshoz kapcsolódó költségek - ingatlanvásárlás 2%	Szállítói finanszírozás
Gépjárművek beszerzése (kis teherautó és terepjáró felszereléssel)	Szállítói finanszírozás
Kisértékű gépek, védőfelszerelés beszerzése	Utófinanszírozás
Információs, tájékoztató és hatósági táblák	Szállítói finanszírozás
Vadkizáró kerítés, kapuk, sorompók kivitelezése	Szállítói finanszírozás
Természeti értékek bemutatása érdekében végzett tanösvényfejlesztés	Szállítói finanszírozás
Általános (rezsi) költség	Utófinanszírozás

A

2 Si



Füredi Péter
Duna-IPOLY Nemzeti Park Igazgatóság
Kedvezményezett

P.H.

Kelt *Budapest*, 2016. év *12* hónap *01*
napján.



Horváth István
Nemzetgazdasági Minisztérium
Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 2016. év *12* hónap *06*
napján.

